
특 수 공 시

목 차

Ⅱ. 특수공시(목차)	51
1) 생태경관보전지역 복원 및 생태탐방로 정비사업	53
2) 명품거리 조성사업	55
3) 황지연못 주변 정비공사	57
4) 화광아파트 재건축사업	59
5) 상수도관망 최적관리시스템 구축공사	61
6) 국민안전체험테마파크 조성사업	64
[별첨] 별지 상세내역	66
1) 시책업무추진비 집행내역	
2) 민간경상보조금 집행내역	
3) 민간행사보조금 집행내역	
4) 출연·출자금 집행내역	
5) 2012년 재정분석	
6) 지방채 발행사업 추진현황	
7) 투·융자 심사사업 추진현황	
8) 행사·축제 원가회계 정보	

생태경관보전지역 복원 및 생태탐방로 정비사업

- 생태·경관보전지역 내의 자연식생이 훼손된 지역 생태복원 필요
- 자연재해 및 잦은 탐방객들로 인하여 훼손된 생태탐방로 정비 불가피



- 생태경관보전지역 내 농경지 등으로 훼손된 생태환경을 인위적인 시설을 최소화하는 방향으로 복원
- 생태관찰 등 체험기회를 제공하는 생태학습장으로서의 기틀을 마련하고 이용자의 안전성, 편리성 확보

● 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2013년
- 위 치 : 창죽동 167번지 일원(대덕산·금대봉 생태·경관보전지역)
- 사업규모 : 생태숲복원(10,392㎡), 기존 훼손 탐방로 정비(277m), 탐방로 정비(330m), 관찰로(350m), 기타 시설물 정비 등
- 총사업비 : 1,950백만원(국비 : 975, 도비 : 292.5, 시비 : 682.5)

● 추진상황

- 2012.02.09 : 실시설계 용역착수
- 2013.01.~04 : 인·허가 및 관련 행정절차 추진
- 2013.04.30 : 실시설계용역 준공
- 2013.05.16 : 계약심사 및 일상감사
- 2013.06.10 : 공사착공


● 향후계획

- 2013.11.06 : 공사준공

● 사업효과

- 생태·경관 보전지역 내의 농경지(밭)로 인하여 자연식생이 훼손된 지역을 생태 숲 등으로 복원하여 생물다양성 증진
- 생태관찰 등 체험기회 제공으로 자연의 소중함을 일깨우는 생태학습장으로써 기틀을 마련하고, 친환경 생태관광 자원을 활용한 『산소도시 태백』 이미지 부각

● 조 감 도(위치도)

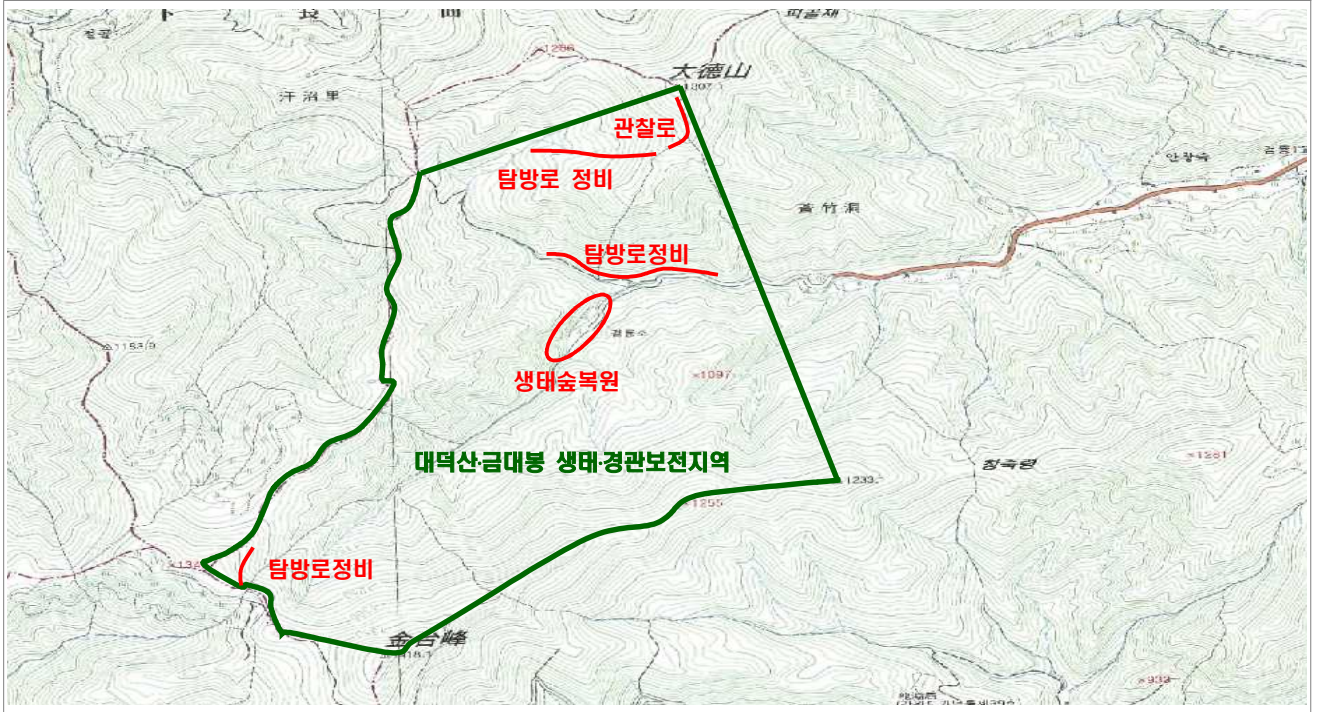

● 현장전경



명품거리 조성사업

- 지역경제 활성화, 지역인재양성, 테마관광개발
- 시민 만족 행정



- 자연과 조화되는 정주형 자주시
- 지속가능하고 경쟁력 있는 고원도시 육성
- 태백권 중심의 미래지향적 복합기능도시 조성

● 사업개요

- 위 치 : 태백시 황지동(시장북로+황지로)
- 사업내용 : 도로정비 L=1,070m, 가로등 52주, 전선지중화 L=1,070m
- 사업기간 : 2012.01 ~ 2013.12.
- 총사업비 : 84억원(국비 : 11, 시비 : 42, 기타 : 31)
- 시 행 자 : 태백시, 한국전력공사

● 추진상황

- 공사 공정율 : 70%(2013.08.01. 기준)
 - 도로포장(기층) L=500m, 전선지중화 관로매설(L=1,070m) 완료

● 향후계획

- 2013년 8월 30일 도로포장 L=1,070m 및 가로등 설치 완료
- 2013년 8월 30일 전선지중화 관로부설 완료
- ※ 준공식 예정 09.10경 예정


● 사업효과

- 산뜻하고 깨끗한 도로경관 형성으로 중심시가지 주변상가 활성화 도모

● 조 감 도(위치도)



● 현장전경

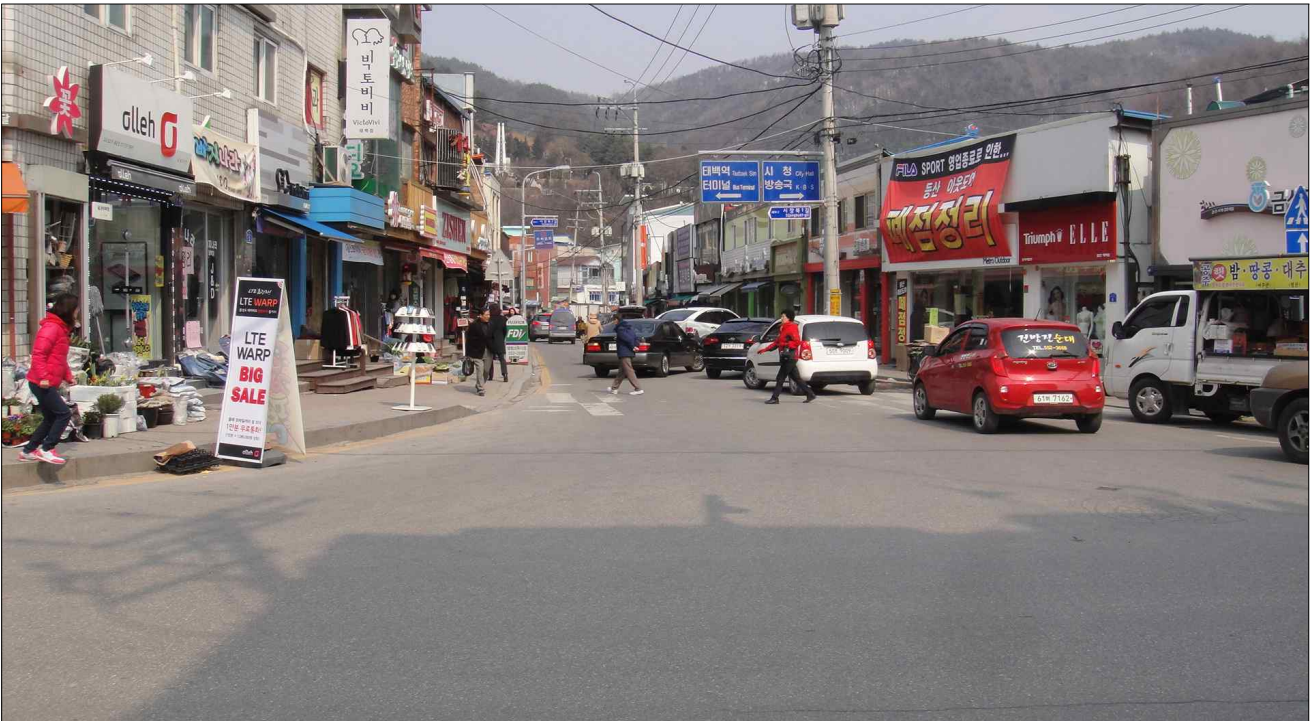

황지연못 주변 정비공사

- 낙동강 발원지 황지연못의 접근 도로망 정비
- 태백의 랜드마크인 문화·관광·경제 중심의 시민공원 조성



- 황지연못을 연못과 시장, 도심을 연계하는 체류형 관광으로 전환
- 물이 흐르고 사람이 모이는 곳으로 황지의 재창조

● 사업개요

- 위 치 : 태백시 황지동 25-2번지 일원
- 사업량
 - 보상 1식(토지 4필지, 지장물 3동)
 - 접근도로 정비 L=90m, B=8m
 - 황지연못 주변 정비
 - 울타리 벤치 1식, 광장, 산책로 동선 판석(화강암) 포장 3,000㎡
 - 수목 식재 : 조형소나무(14본), 산철쭉 등
- 사 업 비 : 3,300백만원(국비 : 1,650, 시비 : 1,650)
- 사업기간 : 2011.03 ~ 2014.10.

● 추진상황

- 지장물 보상 완료 (토지 4필지, 건물 3동) : 2011.10 ~ 2012.05.
- 접근 도로 공사 완료 : 2011.09.27 ~ 2012.11.21.
- 연못 정비공사 착공 : 2013.02.19.
- 노후시설물 철거 : 2013.03 ~ 04.
- 조형소나무, 판석포장 등 : 2013.04 ~ 07.

● 향후계획

- 주변도로 전선 지중화사업 추진 : 2014.02 ~ 06.
- 주변도로 상·하수도 및 스톤블럭 포장 : 2014.06 ~ 10.
- 공사준공 : 2014.10.

● 사업효과

- 낙동강 발원지 황지연못 접근 도로망 정비
- 황지연못의 일회성 관광을 연못과 시장, 도심을 연계하는 체류형 관광으로 전환

● 조감도(위치도)



● 현장전경



화광아파트 재건축사업

장성지역 화광연립의 경우 노후되어, 재난위험우려 및 주거 환경이 열악한 바,



화광연립 일부를 철거하고 아파트를 건립 하므로써 재난위험 해소 및 장성지역 주거환경 도모

● 사업개요

- 위 치 : 태백시 장성동 167-1번지 일원
- 사 업 량 : 기존연립 318세대 철거 및 아파트 건립 360세대
- 사업기간 : 2011년 ~ 2014년
- 사 업 비 : 41,080백만원(국비:10,165, 도비:11,091, 시비:6,209, 용자:13,615)

● 추진상황

- '11년 제2차 중앙재정 투융자 심사 승인 ----- 2011. 07. 27
- 화광아파트재건축 관련 협약 체결(시→석공) ----- 2011. 08 31
- 주요내용 : 보상금액 범위내 석공사원아파트로 공급
- 기존 화광연립 세입자 이주추진 ----- 2011. 10월 ~ 2012. 6. 25
- 이주대상 23개동 318세대 중 318세대 전수 이주완료
- 우선시공분(철거등 공사) 시행 ----- 2012. 06. 30 ~ 12.30
- 본공사 착공 및 시행중 ----- 2013. 03. 27 ~
- '13. 06. 30 현재 공정률 33.2%로 골조공사 진행중

● 향후계획

- 입주자 모집 ----- 2013. 09. ~
- 공사준공 ----- 2014. 08. 28

● 사업효과

- 장성지역 무주택 서민의 주거환경 개선을 통한 주민 정주의식 고취

● 조감도(위치도)



● 현장전경



상수도관망 최적관리시스템구축공사

- 2008년말 태백시 유수율이 30.3%로 전국평균 유수율 81.7%에 비해 상당히 낮아 구조적인 물낭비가 심각하고,
- 종합적인 관망정비 계획수립 미비로 효율적인 유지관리(관망관리 및 누수탐사)에 어려움을 겪고 있음.



- 상수도관망 최적관리시스템 구축을 통한 유수율제고를 통해 수돗물 생산단가를 절감하여 상수도 경영의 효율화
- 블록시스템과 모니터링시스템을 구축하여 안정급수 및 균등급수가 되도록 운영·관리함으로써 수돗물 신뢰도 제고
- 수도공급에 소요되는 에너지를 대폭 절감하여 수도사업을 저탄소형 녹색성장 산업으로 전환하는 계기를 마련코자 함.

● 사업개요

- 위 치 : 태백시 전역(상수도 급수구역 23.2km²)
- 사업개요 : 상수도관망최적관리시스템구축 1식
 - 블록구축 : 대블록 6개, 중블록 9개, 소블록 25개(관리블록 39개소)
 - 블록시스템구축 : 관로시설(배수·급수)17,073m, 유량계(신설교체) 49개소 등
 - 관망정비 : 송배수관(교체·갱생) 65,866m, 급수관 교체 58,009m 등
 - 정보화시스템 구축 : 통합유지관리시스템 구축 1식
- 사업기간 : 2010 ~ 2014년
- 사 업 비 : 65,399백만원(국비 : 31,657, 시비 : 33,742)

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년
총사업비	65,399	10,435	7,149	750	3,776	43,289
국 비	31,657	4,174	3,575	375	1,888	21,645
지 방 비	33,742	6,261	3,574	375	1,888	21,644

※ 턴키공사비 : 555억원{사업기간 : '10.12.29 ~ '14.12.07 (1,440일)}

● 추진상황

- 2009.05 : 가뭄대책수립 일환으로 관망정비사업 추진결정
- 2009.07.23 : 태백권 4개지자체 및 한국환경공단 간 위수탁협약 체결
- 2010.07.21 : 기본계획용역 준공
- 2010.12.14 : 실시설계 적격자 선정((주)한화건설)
- 2010.12.27 : 우선시공분 계약
- 2010.12.29 : 우선시공분 착공
- 2011.04.26 : 실시설계 적격심의
- 2011.04.26 ~ 06.09 : 설계VE(경제성평가) 완료
- 2011.06.03 : 도로점용(굴착)허가 완료(우선시공분)
- 2011.07.21 : 전체분 공사계약
- 2011.09.07 : 1차분 준공검사 완료
- 2011.10.24 : 도로점용(굴착)허가 완료(전체분)
- 그간 공사 추진 실적
 - 1차공사 준공 : 2010.12.29 ~ 2011.08.25
 - 2차공사 준공 : 2011.08.24 ~ 2012.08.31
 - 3차 공사 추진중 : 2012.06.25 ~ 2013.07.31
- 2013. 06월말 까지 공사현황(54.12%)
 - 블록구축 : 블록구축 17개소, 배수관 10,565m, 유량계 20개
 - 관망정비 : 송배수관 29,772m, 급수관 9,188m, 계량기 8,683개


● 향후계획

- 사업준공 : 2014.12.07.

● 사업효과

- 상수도공급량 감소 7,429천 m³/년
- 에너지 절감 : 992천kwh, 온실가스 저감 : 4,903CO₂톤
- 부가적효과
 - 예방적 누수관리 및 최적관망상태 유지
 - 생산·공급비용절감 및 수도경영 효율화
 - 수돗물의 안정적인 공급 및 신뢰도 향상

조 감 도(위치도)

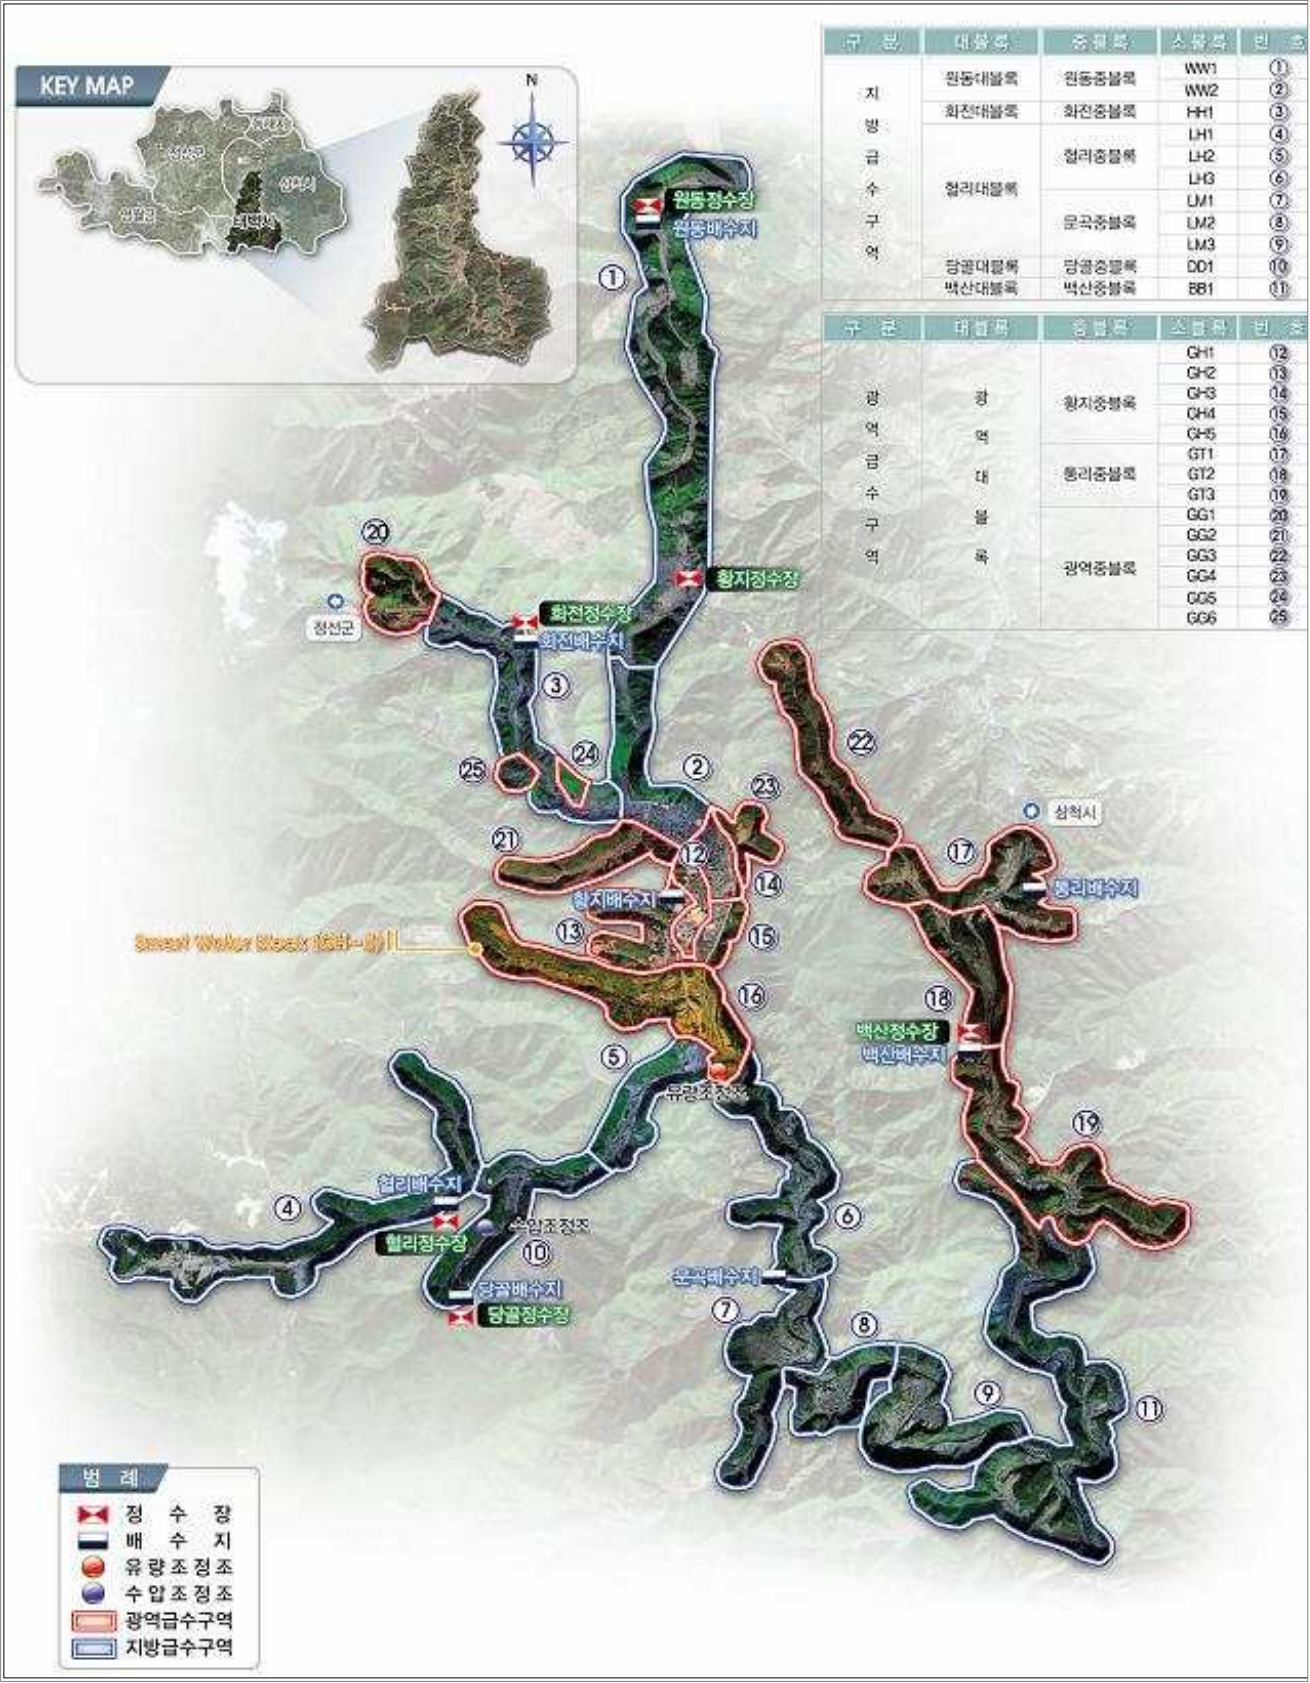

국민안전체험테마파크조성

대정부 합의문 2호에 의거 대체산업육성차원에서
국민안전체험테마파크조성사업 추진



- 안전이라는 주제를 통한 교육과 엔터테인먼트 기능이 복합화된 공익적 테마파크 조성으로 국민 자율 안전의식 함양
- 석탄산업 사양화에 따른 대체산업 육성으로 지역경기 활성화를 도모하고 태백이 중심이 된 국가적 안전사업모델로 추진

● 사업개요

- 위 치 : 강원도 태백시 장성동 31번지 일원
- 사업규모 : 950,376㎡. 연면적 25,959㎡. 진입도로 2개소
- 사업량 : 안전체험관(청소년수련시설), 소방학교, 챌린지시설, 도로2
- 총사업비 : 1,924억원(국비 : 1,133, 도비 : 260, 시비 : 441, 철도 : 90)
- 사업기간 : 2003 ~ 2013년

● 추진상황

- 국민안전체험테마파크조성 착·준공 (100%) — 2006.06.05. ~ 2012.08.17.
- 강원도 소방학교 개교 ————— 2010.05.11.
- 한국청소년안전체험관 개관 ————— 2012.10.31.
- 진입도로 개설 및 확. 포장공사 ————— 2011.11.01. ~ 2013.10.31.
- 총 공정율(2013.07월 현재. 진입도로 포함) ————— 96%

● 향후계획

- 진입도로공사 준공 예정 ————— 2014.08월
[설계변경 요인 발생으로 인한 공기 연장(약 10월)]

● 사업효과

- 석탄산업의 쇠퇴에 따른 침체된 지역경제 활성화 도모
- 안전교육과 휴양기능이 복합화된 테마파크로 대국민 호응 유발

● 조 감 도(위치도)



● 현 장 전 경



